




- 工事写真帳 (イメージ) -

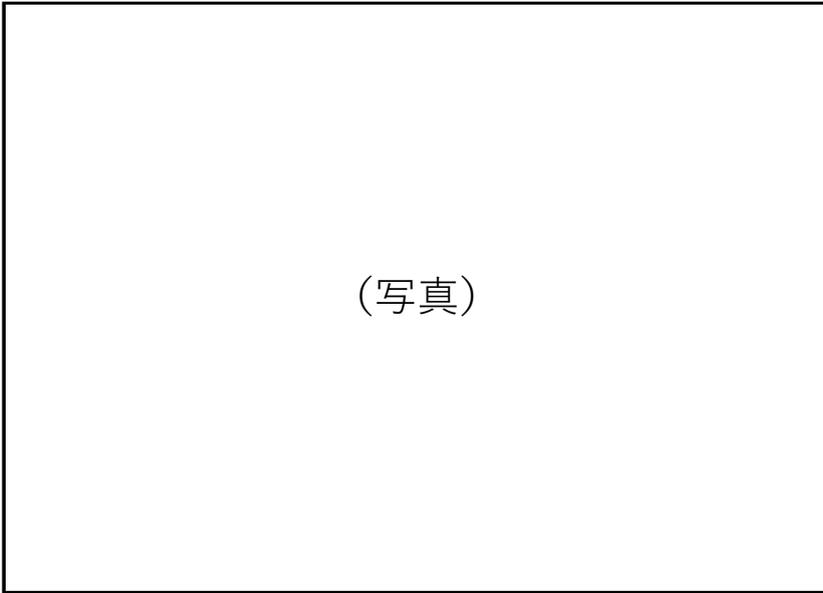

1号マンホール設置
A
基面整正状況

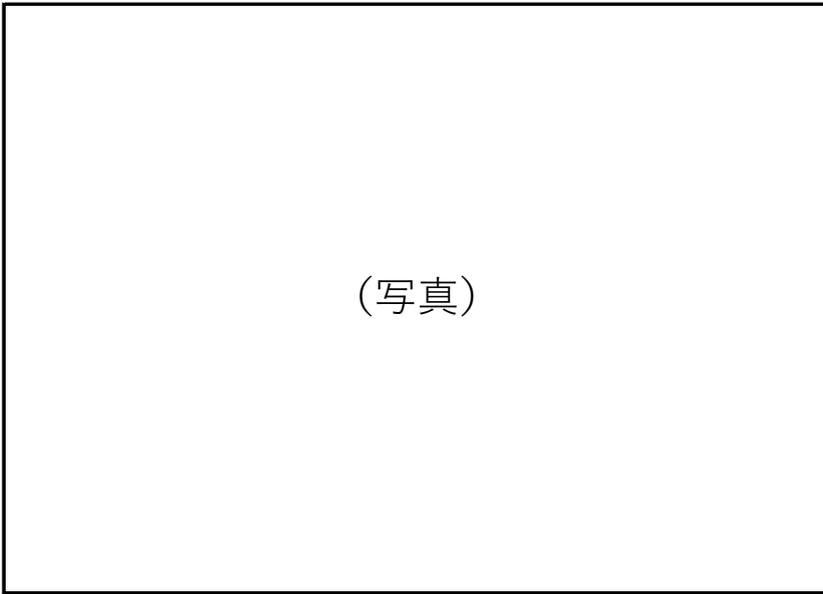

1号マンホール設置
A
基面整正完了

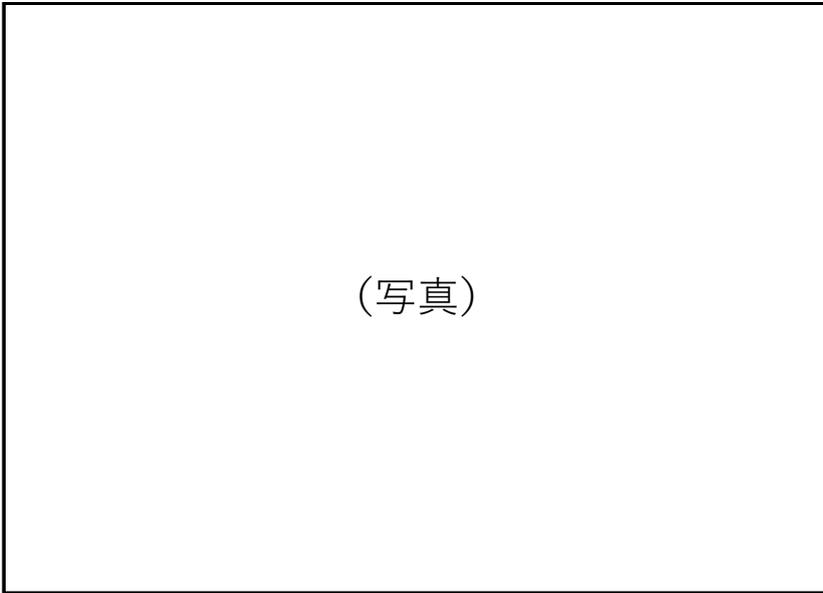

1号マンホール設置
A
床掘 出来形

	設計値	実測値	差
現状地盤高(GL)		2.50	
(H)	1.00	1.00	±0.00
(W)	1.10	1.50	+0.40
(L)	1.20	1.50	+0.30
